

保護者説明会

～増築校舎の供用開始時期の延期について～

令和6年6月1日

牛久市教育委員会 教育施設課

遅延理由

- ・ 建設資材不足や納期遅延
- ・ 建設作業従事者の減少や不足
- ・ 建設機械及びオペレーターの不足




製品の現場への納入遅延につながった。また、工程の遅れを取り戻すことも難しい状況。
増築校舎の建設スケジュール 令和6年7月完成予定→令和6年12月完成予定

変更概要

- ・ 増築校舎の供用開始時期を令和6年8月から令和7年1月に延期
- ・ 延期に伴い、5年生～9年生は増築校舎が完成するまでの期間、北校舎を仮校舎として使用
- ・ 使用に際し北校舎の教室改修工事を実施

北校舎改修案


図面
(改修前)

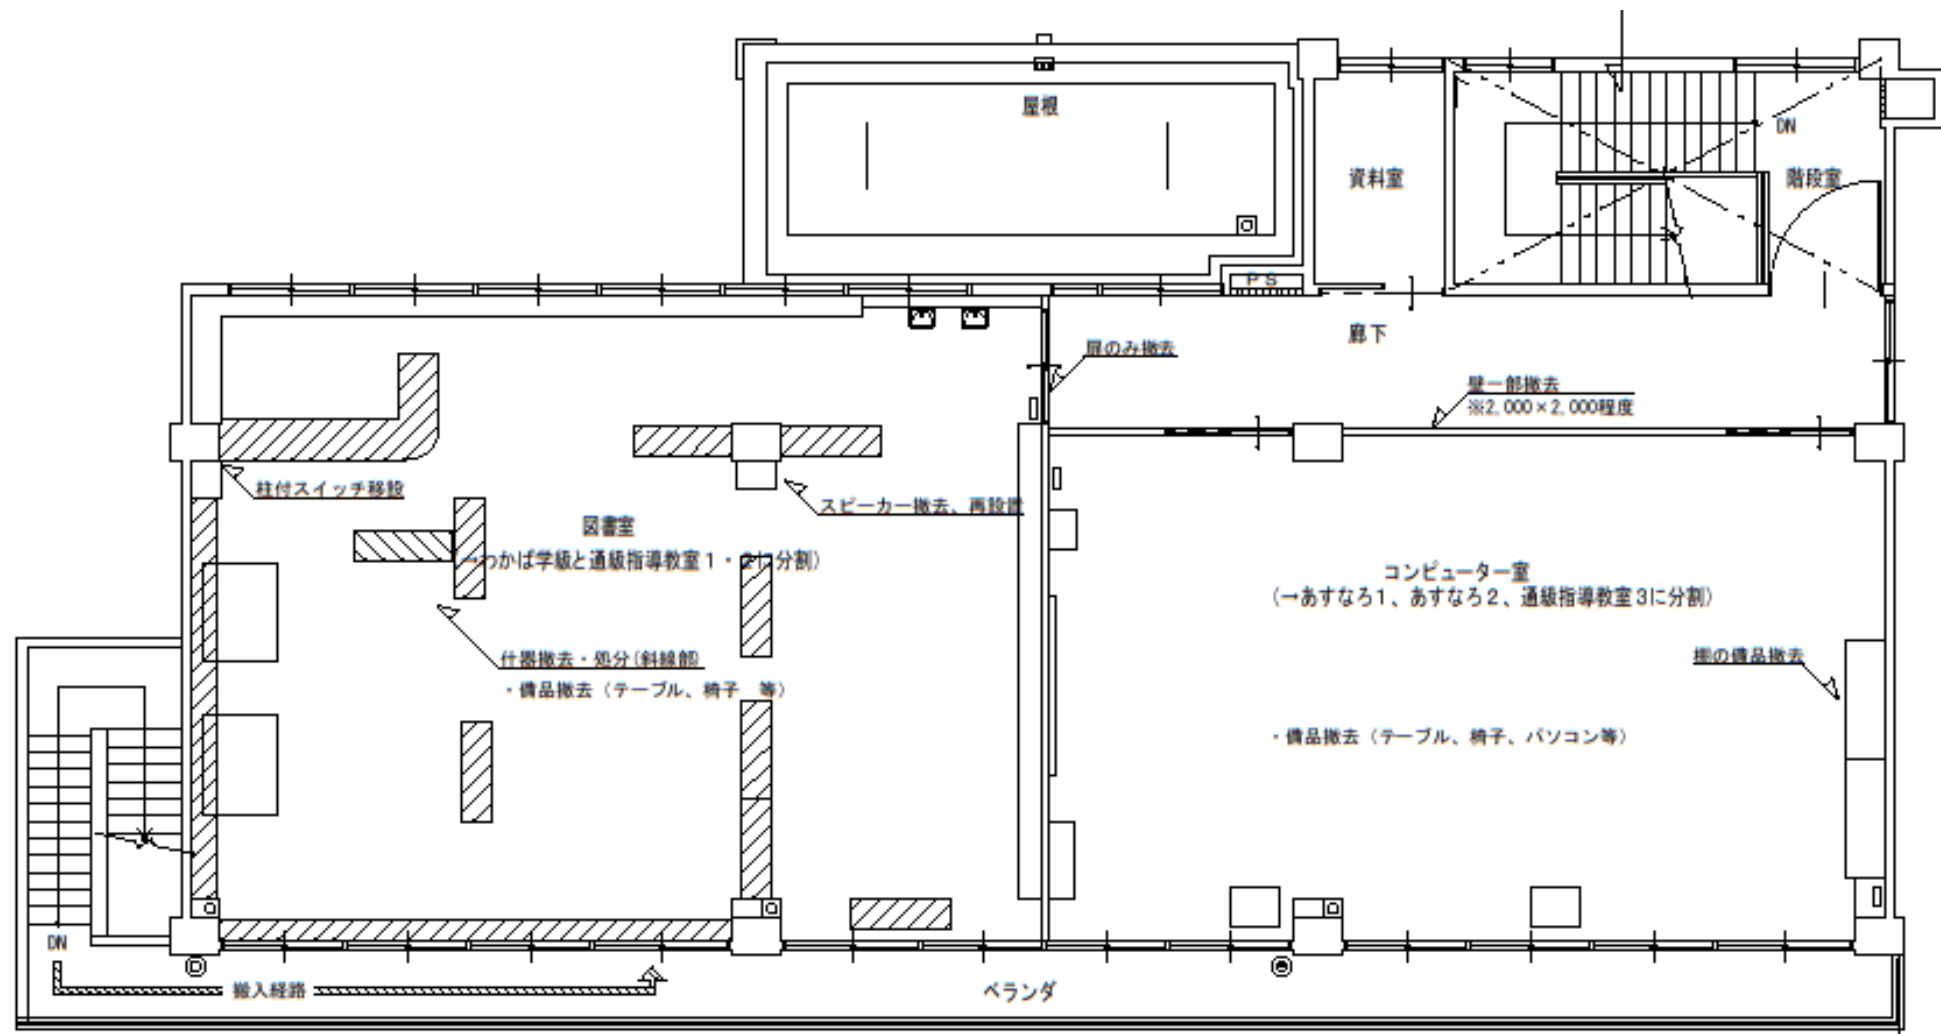

新館 3 階平面図 (既存)
撤去範囲図

北校舎改修案

図面
(改修後)

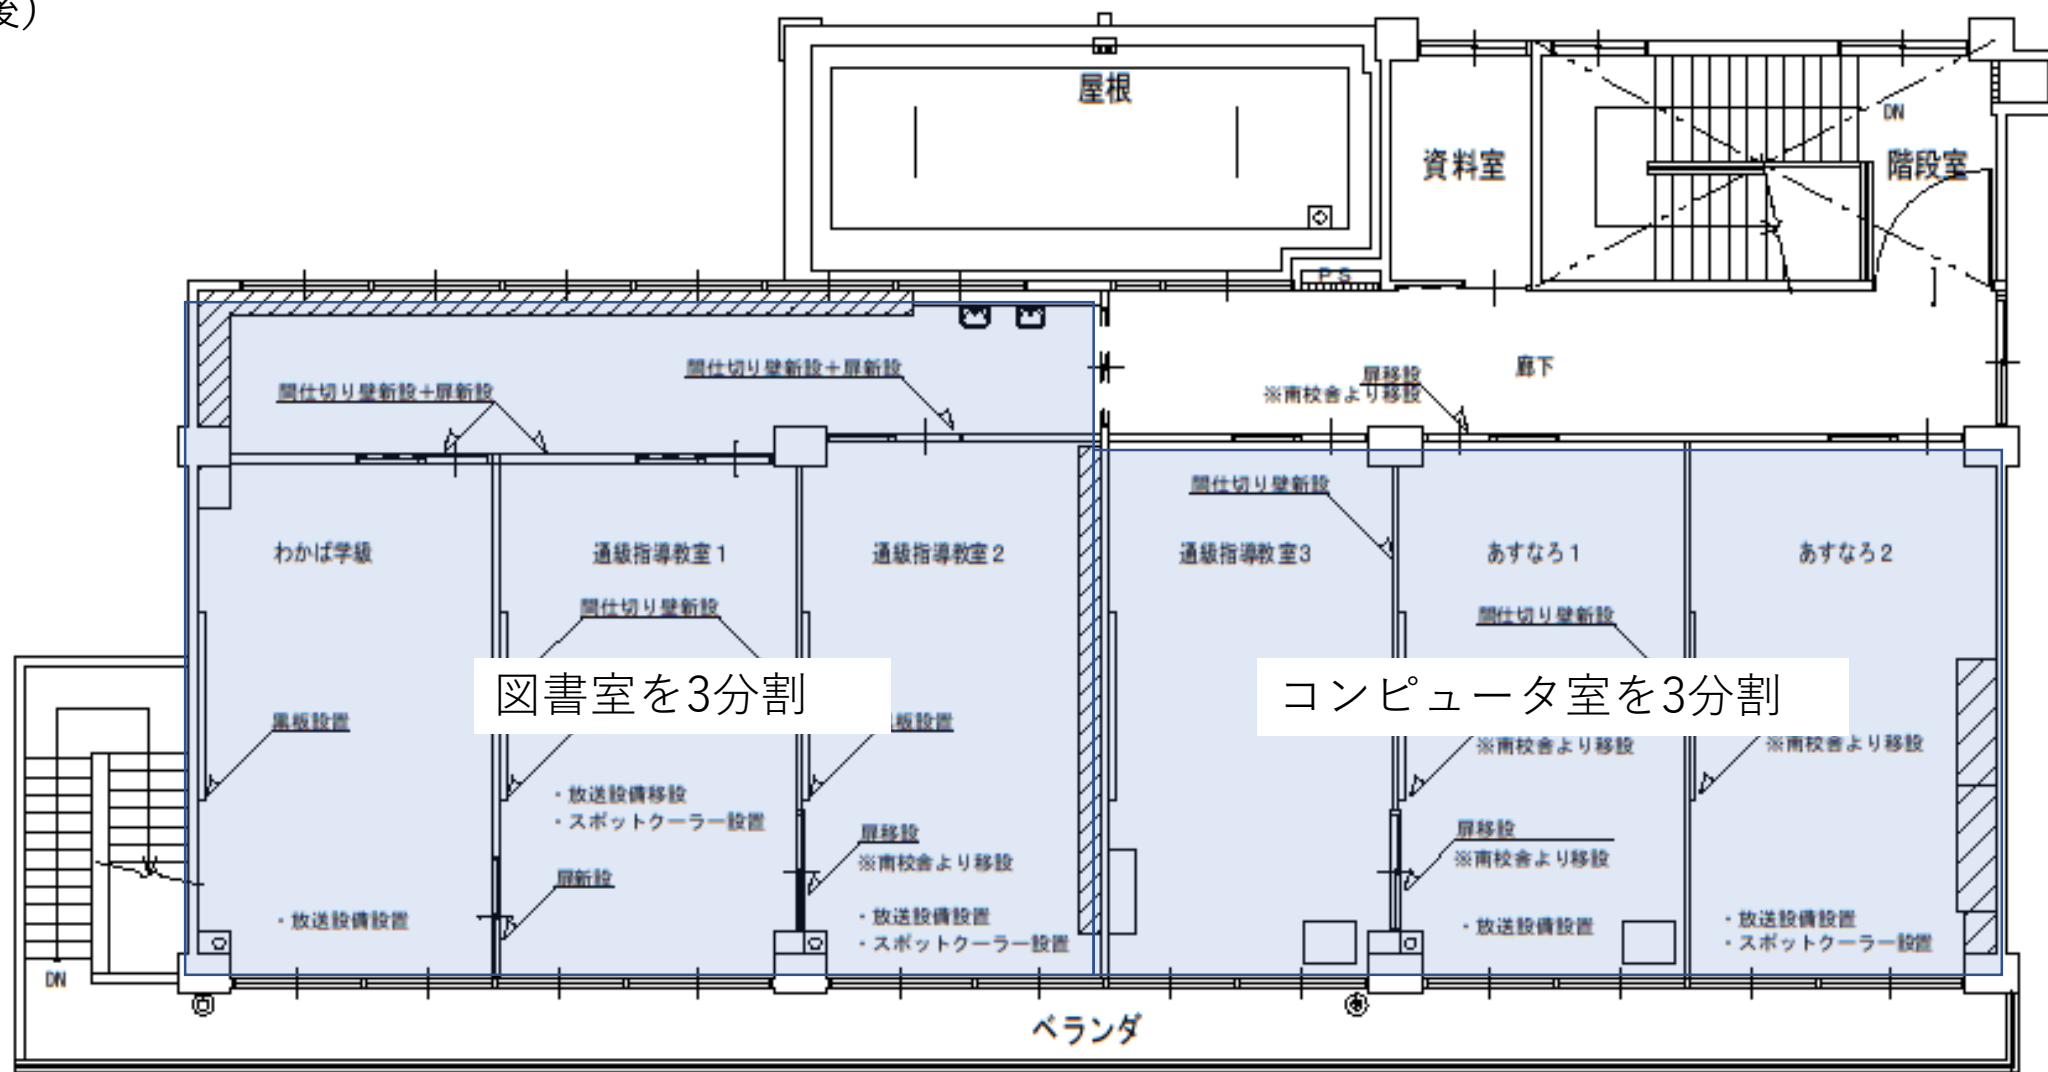

新館3階平面図 (改修後)

今後のスケジュールについて

変更事業工程表案

年		2023 (令和5年)										2024 (令和6年)										2025 (令和7年)							
年度		令和5年度										令和6年度																	
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
学校予定・引越し																						引越し(冬休み)		★引渡	開校				
浄化槽新設					浄化槽新設																								
屋外設備切り回し					屋外設備切り回し																								
既存解体					建屋・浄化槽解体																								
本工事	屋外設備新設													屋外設備新設															
	校舎増築(当初予定)																												
	校舎増築																												
	既存校舎改修																												
	給食室増築改修																												
	体育館・武道場改修																												
	グラウンド																												
	放課後児童クラブ																												
	検査																												
追加工事	北校舎改修																												

外観イメージ

改修により生まれ変わる既存校舎は、思い出を残しつつ新たな機能と景観をつくります



工事につきましては、
日々ご協力いただき、
誠にありがとうございます。

今後も、ご理解とご協力の程、
よろしくお願い申し上げます。

